AI·SW 융합프로젝트

주간보고서

선호 기반 프롬프트 자동 생성 도구

팀 Revealed · 윤정우 · 고차원

2026년 2학기

2026.11.13 보고 | 10주차 | v0.5

금주 11/07 ~ 11/13 | 차주 11/14 ~ 11/20

11/12 추가 검증 반영 · 두 계정 통합·최신 전체 회귀 완료 · 본 보고 1~3쪽

신한대학교
SHINHAN UNIVERSITY

마이크로디그리대학

1. 프로젝트 일정 - WBS

1주차 09/11 ~ 15주차 12/18 | 보고일 11/13, 현재 10주차 | 독립 검증·전체 설계 정리 후 통합 안정화

단계	ID	작업·산출물	담당	1주 09/11	2주 09/18	3주 09/25	4주 10/02	5주 10/09	6주 10/16	7주 10/23	8주 10/30	9주 11/06	10주 11/13	11주 11/20	12주 11/27	13주 12/04	14주 12/11	15주 12/18
분석	1.1	**주제·요구 정리** 검증 목표 구체화	공동	▢	▢	▢						■	▢	▢				
분석	1.2	**선호·코딩 실험** 새 과제 결과 확보	고차원			▢	▢	▢	▢	▢	■	■	▢	▢				
설계	2.1	**설계문서 작성·검토** 전체 설계서 v1.0	윤정우								■	■	▢					
구현	3.1	**개인 지침·재사용** 복귀·요약 조건 보완	윤정우					▢	▢	▢	■	■	▢	▢				
구현	3.2	**팀 조합·인수인계** 권한·팀 지침 보완	윤정우						▢	▢	■	■	▢	▢				
검증	4.1	**통합 검사·복귀 보완** 최신 전체 회귀 통과	공동								■	■	▢	▢				
검증	4.2	**독립 평가·권한 검증** 출력·두 계정 검증 완료	공동									■	▢	▢	▢			
이행	5.1	**운영 점검·시연 안정화** 로컬 확인·배포 미완료	윤정우								■	■	▢	▢	▢	▢	▢	
안정화	5.2	**최종 결과·발표** 예정	공동														▢	▢

▢ 학기 일정안 ■ 기록으로 확인한 활동 ▢ 보고일 10주차

주차는 금요일 시작. 11/09~12 실적은 9주차 칸에 표시하고, 11/13 보고 위치는 10주차로 표시.
초록 칸은 활동 기록이며 전체 작업 완료율이 아님. 담당은 기존 계획 기준, 차주 실행 일정은 3·9쪽 참조.

2. 프로젝트 진행현황

금주 실적 (11/07 ~ 11/13)		차주 계획 (11/14 ~ 11/20)	
▪ **개인 지침·사용 화면** 초안·재사용·요약 조건 충돌 처리 보완 권한 회수 뒤 남던 화면 내용 정리 수정	11/09 ~11/12	▪ **입력·지침 경계 보완 (윤정우)** 요약 길이 정책·조건 충돌 경로 통일 React 한국어·영어 지침 의미 맞추기	~11/16
▪ **팀 공유·업무 연결** 두 계정 화면·실제 HTTP 18시나리오 통과 공유·첨부·회수·버전 충돌·원본 보존 확인	11/12	▪ **비교 세션 접근 정책 (공동)** 개인 보관함과 다른 세션 접근 범위 정리 민감 원문 처리·소유권 정책과 검사 확정	~11/18
▪ **설계·검증·운영** 전체 설계서 97쪽·검증 근거 정리 Python 1,355·프론트 123개 통과, 빌드 성공	11/09 ~11/12	▪ **변경 지침 재검증 (고차원·공동)** 새 원문·과제와 기준을 생성 전 고정 수동과 재비교·유료 API 없이 진행	~11/19
▪ **요약·코딩 독립 검증** 요약 새 원문 9개·코딩 각 8과제 비교 수동 대비 동률, GEPA 원본 유지	11/10 ~11/12	▪ **최종 시연·문서 정리 (공동)** 변경 기능 회귀·설계서·시연 자료 갱신 완료 범위와 공개 배포 여부 별도 정리	~11/20

주요 이슈 및 의사결정 사항	프로젝트 요청 사항
지난주 계획 4묶음: 확인 범위 내 완료. Windows 링크 검사 1개 건너뜀·API 16개 제외. 수동 대비 우위·사람의 편의성은 미입증.	비교 세션 접근 정책·차주 범위 확인. 공개 배포·실사용자 실험은 완료 아님. 추가 통합·회귀 결과는 11~12쪽 참조.

[Backup]

현재 근거는 5~12쪽 | 기존 상세 기록과 그림은 13~30쪽에 보존

- **5쪽 지난주 계획 대비 완료 여부**

  v0.4에서 남았던 두 계정 통합·최신 전체 회귀를 추가 검증해 판정 갱신

- **6~7쪽 요약·코딩 독립 출력 검증**

  이전 평가의 동률·한계 유지. 이번 권한 검사와 프롬프트 성능 평가는 구분

- **8~10쪽 설계서·차주 계획·기존 근거**

  전체 분석·설계서와 다음 개선의 완료 기준. 과거 설계서는 기준 시점 보존

- **11~12쪽 추가 통합·회귀 검증과 수정**

  18시나리오, 전체 검사 결과, 발견한 문제·수정·제외한 검사 범위

- **13~30쪽 11/06 보고의 과거 백업**

  기존 기능·실험·설계 그림·화면은 보존. 현재 판정은 앞의 3~12쪽 적용

이번 추가 검증은 유료 모델 API 0회. 테스트 전용 DB와 합성 계정을 사용하고 기존 사용자 자료는 사용하지 않았다.
보고 기간·학교 표기·본 보고 3쪽 양식은 v0.4와 동일. v0.4 파일과 기존 실험 결과는 덮어쓰지 않았다.

[Backup] 지난주 계획 대비 완료 여부

11/12 추가 통합·전체 회귀 검사 반영 | 네 묶음 모두 아래의 확인 범위에서 완료

지난주 계획·판정	확인한 근거	해석 범위·미포함 사항
저장·재사용 복귀 보완 **완료**	초안·GEPA 결과 보관과 재사용 연결 검사. 이번에는 두 계정 실제 HTTP·브라우저에서 로그아웃 정리·재로그인·저장 내용 복귀 확인.	유료 GEPA 실호출은 미실시. 권한 확인 후 화면 정리를 포함. 사람의 사용 편의성 실험은 아님.
팀 기능·권한 **완료**	18시나리오 통과. 공유·파일 업/다운로드, 미지정/익명 차단·수신자 변경·버전 충돌, 담당 인계·이전 기록·팀 조합 원본 보존.	두 브라우저 계정+교체 대상·익명 대조. 합성 자료의 로컬 검증. 공개 서버 침투 시험은 아님.
설계 대응 전체 회귀 **완료***	전체 설계서 97쪽과 구현 대응 정리. 최신 Python 1,355개·프론트 123개 통과. 빌드 성공, 기준 소스 342개 해시 기록·대조.	*not-api 전체 검사 기준. 환경 제약 1개 건너뜀, API 16개 제외. 공개 배포는 별도 미완료.
독립 평가 **완료**	요약 9원문, 코딩 두 기능 각 8과제의 첫 답변·판정·실행 결과 보존. 일반/수동/제품 비교와 실패·동률 기록.	새 평가 준비·실행 완료. 기존 실험 4차 확증과 다름. 선호 발견·사람의 시간은 미측정.

v0.4의 '일부 완료' 두 항목을 추가 실행 근거로 갱신. 전 제품·보안·배포의 모든 검사가 끝났다는 뜻은 아니다.
상세 실행·수정·원자료는 11~12쪽. 프롬프트 평가 수치와 인간 효과의 미검증 범위는 6~7쪽 그대로 유지.

[Backup] 요약: 조건 준수와 내용 보존

11/10 최종 비교 | 개선에 쓰지 않은 MACSum 영어 원문 9개 | 별도 유료 모델 API 0회

수정: 보존할 문장 확인 → 조건 충돌 시 생성 보류 → 사용자가 해결 방법 선택

평가도 실제 지시문과 같은 분량·표현 조건으로 맞췄다. 수동·당시 현재본·수정본에 같은 보존 대상과 해결된 조건을 제공하고, 핵심 명제·지정 내용·사실 문제는 별도로 판정했다.

독립 지표	수동 프롬프트	당시 현재본	충돌 처리 수정본
분량·표현 동시 준수	9/9	9/9	9/9
핵심 명제 보존	25/27	25/27	25/27
지정 보존 내용	25/27	25/27	25/27
사실 문제 표시 응답	0/9	0/9	0/9

해석: 세 방식 동률. 수정본의 내용 보존 우위는 확인되지 않았으며 누락 2/27이 남았다.

GEPA: 개선 6개·후보 선택 6개·최종 9개 분리. 후보 선택 점수는 원본 0.7778, 후보 0.7222/0.6667로 원본을 채택했다. 무조건 실행할 근거가 없어 선택적으로 유지한다. 실패 성찰 실험도 안정적 이득은 미확보.

두 검토자의 집계 일치. 27은 9개 원문의 핵심 명제 수이며 독립 원문 27개가 아님. 실제 사용자 취향은 미검증.
근거: [E1, E4, D1] (10쪽). 과거 GEPA 평가의 문장 분리 오류·비채택 후보 비교 한계도 설계서 9장에 보존.

[Backup] 코딩 두 기능: 각각 새 과제로 검증

11/12 | 기능별 새 합성 TypeScript/React 8과제 × 일반·수동·제품 = 각 24개 첫 답변

기능 / 독립 지표	일반 요청	수동 프롬프트	제품 프롬프트
AI 답변 방식 4항목 · strict 타입	8/8	8/8	8/8
AI 답변 방식 · 실제 DOM 검사	69/69	69/69	69/69
설명·주석·구성·출력 모두 일치	0/8	8/8	8/8
React 코드 스타일 3축 · strict 타입	8/8	8/8	8/8
React 스타일 · 실제 DOM 검사	56/56	56/56	56/56
구성·스타일 값·타입 모두 일치	1/8	8/8	8/8

확보: 지정 조건을 지침으로 전달했고, 이번 과제의 타입·동작을 유지했다. 수동 대비 우위는 없음.

- 일반에는 취향 조건을 주지 않았으므로 낮은 조건 일치는 지시 위반이 아니다.
- 4항목 판정 96/96 일치, 스타일 판정 71/72 일치. 불일치 1건은 보존했고 전체 조건 집계는 같았다.
- 알려진 목표를 넣은 작은 합성 과제다. 사람의 선호 발견·편의성·수정 시간·운영 품질은 미측정.
- React 영어 지침+공통 strict 예외 조건의 결과. 한국어와 의미 차이는 남아 있으며 차주 보완 대상.

ReactDOM/JSDOM 동작 실행과 실제 TypeScript 검사를 수행. 전체 브라우저·보안 검사 또는 운영 GEPA의 검증이 아님.
근거: [E2, E3, D1] (10쪽). 두 기능 점수는 합산하지 않으며 Codex 사용량과 별도로 유료 모델 API 호출은 0회.

[Backup] 전체 분석·설계서와 현재 범위

주간보고와 별도 산출물 | Revealed 분석·설계서 v1.0 · 97쪽 · 11/12 기준

설계 영역	이번에 정리한 내용
분석·요구사항	제품 목적·대상·범위, 기능/비기능 요구, 근거와 미검증 주장 구분
사용자·화면	상세 유즈케이스 24개, 논리 화면 18개, 입력·오류·권한·복귀 상태
처리·구조	선택·조건 해결·저장·재사용·팀 연결 처리와 클래스/시퀀스 등 도식 21개
API·데이터	GET/POST 경로 90개, SQLite 테이블 16개, migration 14와 데이터 사전
운영·검증	접근 권한·비용·저장·실패 복구, 독립 평가 원자료·한계, 요구 추적

GitHub에 문서 전용 공간과 읽기 전용 검증 근거를 게시했습니다.

전체 분석·설계서 및 원자료 열기 · codex/system-design-2026-11-12 · 8531b21

운영 보완: 비교 메모리 세션의 계정 접근 정책, 긴 요약 원문의 절단/거절 방식 차이,
React 영어·한국어 지침 의미 차이를 발견했다. 문서화와 제품 수정 완료를 구별한다.

기준: 로컬 HEAD 4302412 + 진행 중이던 요약 수정. 문서 게시가 앱 변경의 원격 반영·배포 완료를 의미하지 않는다.
근거: [D1] (10쪽). 전체 PDF를 렌더링해 확인했으며 코드·데이터 사전·실험 사본의 해시를 기록했다.

[Backup] 차주 계획과 완료 기준

11/14~11/20 계획 | 완료한 통합 검사는 보존하고 다음 변경의 경계·검증에 집중

계획·담당·기한	완료로 판단할 근거	범위·실행 원칙
입력·지침 의미 정렬 윤정우 / ~11/16	요약 두 경로의 길이 제한·오류 안내 대조. 한·영 React 3축 지침의 예외·역할 분리 정렬. 경계값·조건 충돌·출력 회귀 통과.	변경 전후 지침과 원인을 기록. 기존 저장본 자동 덮어쓰기 금지.
비교 세션 접근 정책 공동 / ~11/18	ID 기반 메모리 세션의 접근·민감 원문 정책 확정, 필요한 소유권/수명 검사 설계·반영. 개인 보관함·인수인계 권한 검사 유지.	이번 인수인계 통과를 모든 메모리 세션의 계정 격리로 확대 해석하지 않음.
변경 지침 재검증 고차원·공동 / ~11/19	변경 경로에 새 자료·수동 지침·평가 기준을 먼저 고정. 첫 답변을 독립 생성·보존. 조건·내용/타입·동작을 나눠 평가.	유료 API 없이 보조 에이전트. 우위가 없으면 동률·저하 보고. 새 표본 수는 실행 전 확정.
시연·문서 정리 공동 / ~11/20	변경 기능 회귀, 요구·화면·API·DB 대응 및 시연 자료 갱신. 완료 범위·남은 이슈·공개 배포 여부를 구분해 기록.	이미 통과한 검사도 코드 변경 영향이 있으면 다시 확인. 실사용 효과는 별도 후속 과제.

이번 주 두 계정 통합·최신 전체 회귀는 실행 완료했다. 새 변경 없이 단순 반복 검사 횟수를 성과로 늘리지 않는다.
유료 모델 실행·공개 배포·실사용자 만족도와 시간 절감은 이번 기술 검증의 완료 범위에 포함하지 않는다.

[Backup] 보고 근거와 읽는 순서

수치는 실험 원자료와 대조 | 기존 결과를 재생성·수정하지 않고 보고에 인용

[H1] 복귀·권한 개선 (11/09)

docs/history/2026-11-09_microstone_improvements.md

[H2] 팀 지침·전체 회귀 (11/09)

docs/history/2026-11-09_coding_workflow.md

[H3] 재사용·두 경로·UI 확인 (11/10)

docs/history/2026-11-10_goal_and_ui_check.md

[E1] 요약 조건·보존 최종 비교

benchmarks/summary_contract_revision/results/2026-11-10/scores.json

[E2] AI 답변 방식 4항목 비교

benchmarks/coding_react_current/results/2026-11-12/scores.json

[E3] React 코드 스타일 3축 비교

benchmarks/react_style_current/results/2026-11-12/scores.json

[E4] 실제 GEPA 오프라인 탐색

benchmarks/summary_gepa_offline/README.md

[D1] 전체 설계서·문서 QA

docs/system-design/validation.json

공개 설계서·검증 근거 폴더 → chapters/09-verification.md, evidence/

기존 H/E/D 근거는 그대로 보존. 이번 추가 검사 원자료는 docs/verification/2026-11-12/results.json과 results/ 참조.
지난주 계획 원본은 v0.3 3쪽. 과거 백업은 현재 13~30쪽이며 최신 통합·회귀 결과는 11~12쪽을 적용.

[Backup] 두 계정 공유·첨부·권한 통합 검증

11/12 | Chromium 실제 화면 + 프로덕션 빌드 + 로컬 HTTP + 테스트 SQLite | 18/18 시나리오 통과

검증 묶음	실제 확인한 내용
계정·비공개 원본	쿠키가 분리된 두 브라우저 계정. 미공유 본문·개인 지침은 타 계정 거절, 익명은 로그인 요구.
첨부·공유·다운로드	화면에서 파일 선택·저장·공유. 수신자 다운로드 바이트 일치와 새 탭 UTF-8 미리 보기 확인.
권한 회수·이전 기록	교체 대상 계정에 재공유 후 이전 수신자의 본문·기록·첨부 거절. 공유 전 기록도 접근 거절.
충돌·담당 인계	오래된 창 저장은 409와 초안 보존, 최신 서버 값 유지. 이어받은 수신자만 편집·완료·재개.
첨부 이력·복귀·팀 기준	현재 첨부 제외 후 허용된 과거 버전은 보존. 로그아웃 초안 정리·재로그인, 팀 초대·조합 출처 보존.

수정한 문제: 권한이 사라진 작업을 다시 열어 거절받아도 이전 내용이 화면에 남음.

응답 상태를 구분하고 현재 접근 불가를 확인하면 화면·목록·임시 초안을 정리한다.
없는 과거 기록, 일시 장애, 단순 버전 충돌에서는 유효한 작업과 미저장 내용을 보존한다.
수정 전 실제 브라우저 재현 → 관련 회귀 10/10 → 수정 빌드의 전체 18시나리오 재실행 순으로 확인.

두 활성 계정 외에 수신자 교체용 1계정·익명 대조 포함. 팀 기준 조합·초대 권한은 같은 쿠키의 실제 HTTP로 검사.
로그·실행 코드: docs/verification/2026-11-12/ (12쪽). 이미 받은 파일·클립보드를 회수하는 기능은 아니다.

[Backup] 최신 전체 회귀 검사와 수정 근거

11/12 | 같은 코드·기존 의존성 | 유료 모델 API 0회 | 원자료와 소스 해시 보존

검사	수정 전/관련 검사	최종 결과
Python not-api 전체	정상 연결 환경: 1,353 통과·4 실패	1,355 통과·0 실패·1 건너뜀
프론트 전체 / 빌드	초기 120 통과 / 빌드 성공	회귀 3개 추가 후 123 통과 / 성공
계정·팀 통합 시나리오	권한 거절 뒤 화면 잔류 재현	18/18 통과
수정 관련 묶음	도메인·조건 처리 122개 / UI 10개	모두 통과 (전체 검사와 중복)

전체 검사의 4개 실패 원인: 요약 보조 설정을 엔진 도메인 정의로 잘못 수집.

보조 설정 1개만 명시적으로 분리하고 영어·한국어 전용 형식 검사 2개를 추가했다. 나머지 모든 도메인은
기존 검사를 유지한다. 보조 설정을 오인한 4건이 전용 2건으로 바뀌어 최종 검사 수가 달라졌다.
설정 파일의 기존 경로·바이트와 고정 실험 결과는 유지했다. 최종 검사 기준 소스 342개의 해시를 기록·대조했다.

제외·한계: 실제 API 검사 16개 제외. Windows 심볼릭 링크 생성 권한 부족으로 1개 건너뜀.
기존 500KB 초과 번들 경고는 남아 있다. 초기 격리 환경의 로컬 연결 실패는 제품 결과에서 제외하고 재실행했다.

원자료: docs/verification/2026-11-12/results.json 및 results/의 backend-final.log·frontend-final.log·browser.json.
테스트 DB·키·쿠키는 보고서에 포함하지 않음. 공개 배포·실제 모델 출력 품질·사람의 효과는 별도 검증이다.

2. 프로젝트 진행현황 - 개인 지침·사용 화면

윤정우 진행 영역 | 이번 주 기능 개발·화면 정리 실적

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
코딩 입력 흐름과 예시 선택 환경 → 4항목 선호 → 지침 확인 14개 언어 예시·FastAPI/Spring 전용 예시	11/03~04	**대표 저장·재사용 흐름 확정** React 환경에서 선택 → 저장 → 재사용 기존 추정 경로와 직접 선택 경로 구별	~11/07
내 선호 보관함과 재사용 지침·선택 설정 저장, 수정·새 작업 복사 선택 출처와 본문 불일치 안내	11/03~04	**초안과 진행 작업 복귀 보완** 상단 메뉴 이동 시 입력 손실 해결 GEPA 작업 번호·완료 결과 재열람	~11/10
화면 안내와 실제 자료 정리 선택 후 다음 버튼·보류 항목·취소 처리 요약·코딩·팀 업무 실제 화면 19장 문서화	11/04	**화면·기능 대응 확인** 설계 화면 ID별 정상·예외 흐름 점검 저장한 설정과 재사용 지침 일치 확인	~11/12
답변 확인과 선택적 개선 형식 단서·직접 확인 질문 제공 13개 환경의 GEPA 실행 경로 연결	11/04		

주요 이슈 및 의사결정 사항	프로젝트 요청 사항
새 코딩 흐름은 항목별 명시적 선택. 14개 언어 예시는 언어별 실행 검증이 아니며 GEPA 연결과 실제 개선 효과는 별도로 관리.	윤정우 진행 영역: 화면·지침·보관·재사용. 교수님 검토: 핵심 흐름과 보조 기능의 범위.

2. 프로젝트 진행현황 - 팀 공유·업무 연결

윤정우 진행 영역 | 기존 개인화 지침을 공유·재사용하는 활용 확장

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
팀 초대와 개인·팀 기준 비교 비교 전에 팀 생성·초대 링크 제공 지원 분류의 차이·동률·미정 표시	11/03	**두 계정의 권한 시나리오 점검** 공유 전 기록·권한 없는 파일 접근 차단 담당자 변경·버전 충돌·완료 후 처리	~11/09
작업용 조합과 변경 이력 항목별 개인/팀 출처 선택·별도 새 저장 재조합·선택 되돌림·직전 항목 연결	11/03	**조합의 원본 보존 확인** 출처·전후 차이·직전 연결 검토 새 항목 저장과 원본 미변경 점검	~11/11
인수인계와 참고 파일 첨부 목적·진행·남은 일·지침·자료 저장 지정 계정에 공유·이어받기·완료·버전 기록	11/03~04	**핵심 시연과 보조 기능 구분** 코딩 저장·재사용을 본 발표에 배치 팀·인수인계는 활용 확장으로 설명	~11/12
반복 업무 템플릿과 요청 점검 템플릿 24개: 기존 비교 6 + 새 초안 18 요청 구조 점검·업무 지침 작업 공간 연결	11/03~04		

주요 이슈 및 의사결정 사항	프로젝트 요청 사항
새 언어별 직접 설정 지침은 React 팀 기준에 자동 조합하지 않음. 다수 선호 집계를 합의 완료·협업 시간 절감으로 주장하지 않음.	윤정우 진행 영역: 팀 조합·이력·인수인계. 두 계정의 기능 점검은 팀 내부에서 수행하며 신규 참여자 모집을 필수 조건으로 두지 않음.

2. 프로젝트 진행현황 - 설계·검증·운영 준비

11/05는 문서화 실적 | 테스트 수치는 11/04 기록이며 이번 문서 작성 중 새로 실행한 결과가 아님

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
설계 산출물 작성 요구사항·UML·ERD·테이블·API 정리 화면 정의·와이어프레임·WBS 작성	11/05	**설계와 구현의 대응 검토** 요구사항 ID → 화면 → API → DB 확인 문서 검토 후 GitHub 공유본 갱신	~11/08
회귀 검사와 남은 문제 정리 프론트 86 통과·빌드 통과 Python 1,083 통과·1 실패, 단독 재실행 통과	11/04	**실패·복귀 경로 보완과 재검사** Windows 인코딩·초안·작업 복귀 개선 같은 환경에서 전체 회귀 결과 기록	~11/11
호스팅 실행 구조 준비 React + API 동일 주소·Docker·영구 저장 로컬 재시작 후 계정·지침·첨부 유지 확인	11/04	**운영 조건과 통합 범위 결정** 저장 유지·백업·HTTPS 확인 항목 정리 연구 변경은 필요한 부분부터 선별	~11/12
개발 기록과 수업 자료 정리 기능별 변경 기록·19장 화면·공유 자료 현재 구현과 연구 브랜치의 차이 정리	11/04~05		

주요 이슈 및 의사결정 사항	프로젝트 요청 사항
실패 항목만 UTF-8 재실행에서 통과. 전체 회귀 통과로 합산하지 않음. 호스팅 준비는 공개 배포 완료가 아님.	윤정우: 문서·운영·복귀 흐름 보완. 공동: 설계 검토와 연구 코드 통합 범위 확인. 새 설계문서는 로컬 작성 상태.

2. 프로젝트 진행현황 - 기존 코딩 실험 (고차원)

실험 A = 지침 없음, B = 선택으로 조립한 지침 | 화면의 예시 A/B와 다른 표기

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
선택 조립 지침 효과 (1·2·3차) 스타일 축: +28.89 / +27.78 / +23.33%p 기능: -1.67 / -16.67 / -6.67%p 차이 = B-A (두 지표를 함께 보고)	11/04	**React 비교 조건 고정** 스타일·기능·미확인을 따로 기록 최적화에 쓰지 않은 새 과제 확보	~11/08
AI 재서술 단계의 사용 판단 두 차수 추가 이득 기준 미충족 재서술 구현 보존·기본 사용 비활성	11/03~04	**평가 도구와 수정의 선별 통합** 현재 서비스와 변경 단위로 대조 독립 평가·보호 규칙·회귀 여부 확인	~11/11
평가 도구와 후속 과제 점검 다중 파일 진입점 처리 수정·재채점 4차는 적합 과제 부족으로 확증 미실행	11/04	**실행한 범위의 결과표 작성** 과제 ID·모델·검사 조건·실패 기록 미실행 비교는 계획 상태로 유지	~11/12

주요 이슈 및 의사결정 사항	결과 해석과 검증 범위
모의 프로필 4 × 과제 5 × 3회 = 60단위. 1차 기능 95% 구간: [-13.33, +10.00]%p. 1·2차 기능은 검사 도구 수정 후 재채점.	1차 구간은 0 포함: 차이를 확인 못함. 2·3차 기능 저하 관찰, 원인은 미분리. 실제 사용자 만족도·협업 효과 검증 아님.

3. 기존 연구와 이번 구현의 연결

중심 주제 유지: 선택한 선호 → 지침 생성 → 보관 → 새 작업 재사용

비교 항목	고차원: React 코딩 연구	윤정우: 기능 개발·사용 흐름
질문	선호 지침이 스타일·기능에 미치는 영향	지침을 만들고 보관·공유·재사용하는 방법
선호 입력	반복 결과 비교와 선택 이력으로 추정 파일 구성·스타일 관리·타입 표기	준비 예시 또는 직접 설정 설명·주석·구성·출력 방식
주요 산출물	비교 조건·자동 평가기·실험 결과	화면·계정별 저장·조합 이력·인수인계
개선 경로	선호 문장 재서술의 추가 이득 평가	선택적 GEPA: 원본 고정·보충 안내 탐색
현재 근거	모의 프로필의 스타일·기능 검사	구현·회귀·예시 계정 동작 / 효과는 별도 검증
다음 연결	평가 도구·실패 분석·보호 규칙	대표 React 흐름·독립 과제·저장 일관성

기존 연구 결과를 다른 선호 축·다른 언어·팀 생산성의 증거로 그대로 옮기지 않는다.

4. 다음 주 계획과 완료 기준

11/06 ~ 11/12 | 담당은 다음 작업 제안 / 사용자 모집 없이 기술적 동작과 독립 과제 중심

기한·담당	할 일	보고할 산출물·완료 기준
~11/07 윤정우	대표 React 시연 경로 고정	선택 → 지침 → 저장 → 새 작업 재사용 UI02~05 화면·요청·저장값 대응
~11/08 공동	설계 검토와 공유본 정리	요구사항 ID·UML·ERD·API·화면 연결 검토 수정사항과 GitHub 공유 경로
~11/09 고차원	독립 평가 과제·조건 고정	과제 ID·일반/선호 지침·기능/스타일 판정 기준 최적화 과제와 분리, 미확인 처리 규칙
~11/10 윤정우	초안·진행 작업 복귀 보완	상단 이동 전후 입력 유지 또는 경고 GEPA 작업 번호·상태·완료 결과 재열람
~11/11 공동	권한·연구 변경·회귀 확인	두 계정의 공유·첨부·revision 시나리오 연구 변경별 적용과 동일 환경 전체 검사
~11/12 공동	실행 결과와 주간보고 갱신	실행한 과제별 결과·실패·호출 기록 미실행 비교·미배포는 계획 상태 유지

실제 AI 비교는 범위·호출 상한을 먼저 정함. 만족도·협업 시간 절감은 자동 평가만으로 주장하지 않는다.

[공유 자료] 설계문서·코드·검증 기록

링크는 확인한 커밋에 고정 (당시 코드·결과 재확인용) / 새 설계문서는 로컬 작성 상태

현재 구현 코드·기능 소개	서비스 구현 기준 · commit a2f1292
DB / API 구현 근거	app_db.py / api_server.py
전체 점검과 남은 문제	회귀 수치·초안 손실·작업 복귀
호스팅 준비와 검증 범위	로컬 준비 / 공개 운영은 미확인
고차원 React 실험·재채점 근거	codex/coding-ai-upgrade · fee9d1c

이번 수업용 설계 산출물

docs/weekly_reports/2026-11-05/Revealed_설계문서_2026-11-05.md

기능·비기능 요구사항 / WBS / UML 4종 / 전체 ERD·테이블 / 핵심 API / 화면 사양
새 문서는 로컬 작성 상태이며 원격 업로드 완료로 표기하지 않음.
수업 검토: 기능 범위·문서 수준·독립 평가 범위·다음 주 우선순위

[설계] 기능 요구사항

요구사항 식별자와 현재 상태를 함께 관리 | 상세 근거·인수 기준은 별도 설계문서

ID	기능	요구사항	상태
FR01	계정·권한	로그인 계정별 보관함·작업을 구분한다.	구현
FR02	기존 선택 비교	요약·React 결과를 비교해 지침을 만든다.	기존 유지
FR03	코딩 선호	환경과 설명·주석·구성·출력 4항목을 직접 정한다.	구현
FR04	저장·재사용	지침·선택 설정을 저장하고 새 작업에 재사용한다.	구현
FR05	개인·팀 조합	지원 분류의 기준을 비교해 항목별 출처를 고른다.	구현·범위 제한
FR06	조합 변경 이력	재조합·선택 되돌림을 별도 항목으로 저장한다.	구현
FR07	인수인계·첨부	목적·진행·남은 일·파일·지침을 공유하고 이어받는다.	구현
FR08	업무 지침	24개 템플릿과 요청 구조 점검·작업 공간을 제공한다.	구현
FR09	선택적 GEPA	지원 환경에서 원본 고정·보충 안내 탐색·새 저장을 한다.	연결 구현
FR10	답변 확인	형식 단서와 직접 확인 질문을 제공한다.	구현
FR11	초안·작업 복귀	상단 메뉴 이동 뒤 초안과 진행 작업을 복구한다.	미완료

FR05: 지원 분류만 팀 조합. FR08: 기존 비교 6 + 새 초안 18. FR09: 연결 구현과 효과 검증 구별.

[설계] 비기능 요구사항과 문서 작성 현황

구현 결과를 11/05에 문서화 | 코드와 설계의 대응 검토는 다음 주 진행

ID·항목	요구사항	상태
NFR01 접근 통제	소유자·지정 수신자와 요청 버전을 확인한다.	구현 / 권한 검사 기록
NFR02 데이터 일관성	revision 충돌을 거절하고 조합 원본을 보존한다.	구현 / 회귀 확인
NFR03 지속성	SQLite 저장 자료를 재시작 후에도 유지한다.	로컬 확인 / 운영 미확인
NFR04 비용 제한	GEPA 작업당 요청 32회·성찰 4회, 동시 2개/계정 1개.	구현 / 실비·지연 미측정
NFR05 첨부 제한	파일 5MiB·현재 10개·이전 포함 작업당 20MiB.	구현 / 경계·권한 검사
NFR06 평가 추적성	평가 버전·별도 과제·실패·미확인을 구분한다.	기록 구현 / 효과 후속 검증
NFR07 사용 흐름	선택→생성→저장→재사용과 이동 복귀를 보장한다.	일부 확인 / 복귀 보완 필요
NFR08 운영 품질	HTTPS·백업 복구·실제 접속·응답 시간을 확인한다.	계획 / SLA 미설정


작성 산출물

요구사항 · Use Case / Class / Sequence / State · ERD / 13개 테이블 정의
핵심 API 명세 · 화면 정의 / 와이어프레임 / 스토리보드 · WBS

상태: 로컬 작성 완료 → 팀 검토·수업 피드백 → GitHub 공유본 반영

[설계] 시스템 구성도


React 웹 화면 + Python HTTP API + SQLite | 직접 조립과 실제 AI 호출 경로를 분리

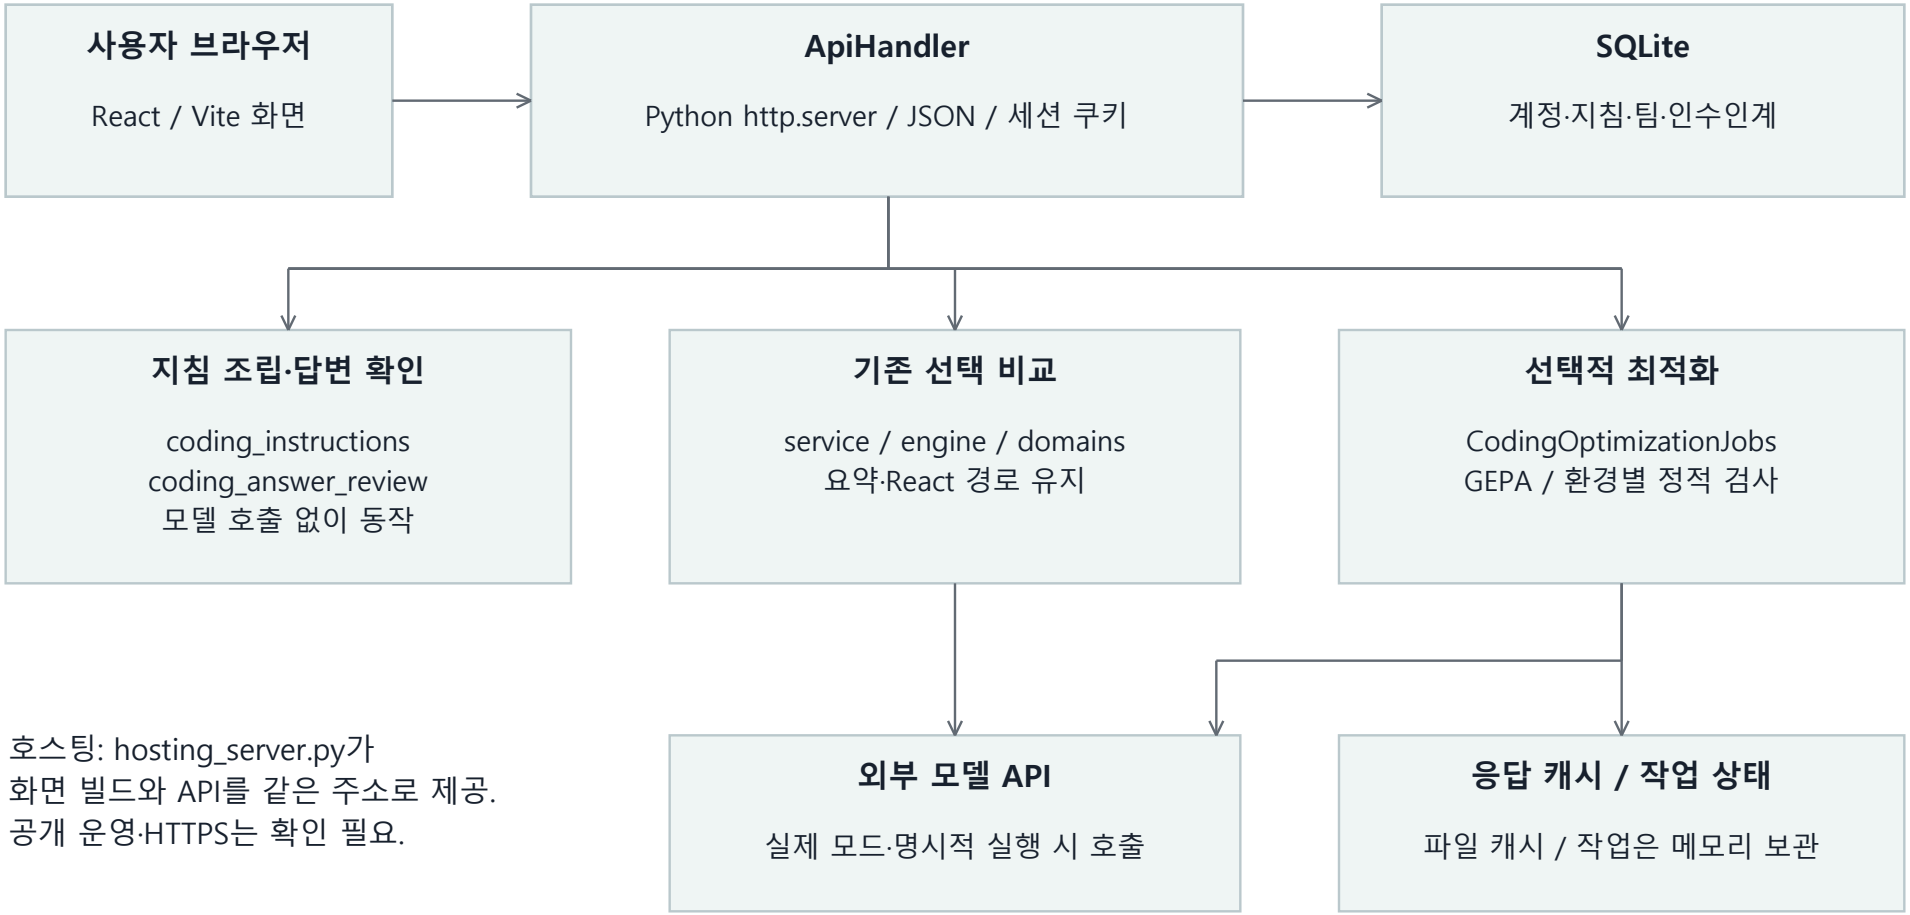

FastAPI는 생성 코드의 대상 환경이다. 이 앱 API 서버를 FastAPI 기반이라고 표기하지 않는다.

[설계] UML - 개인 지침 Use Case


사용 목적별 분리 · 회원 액터 일반화 · 팀 기준·인수인계와 상세 명세는 별첨 UML 2·3·8쪽

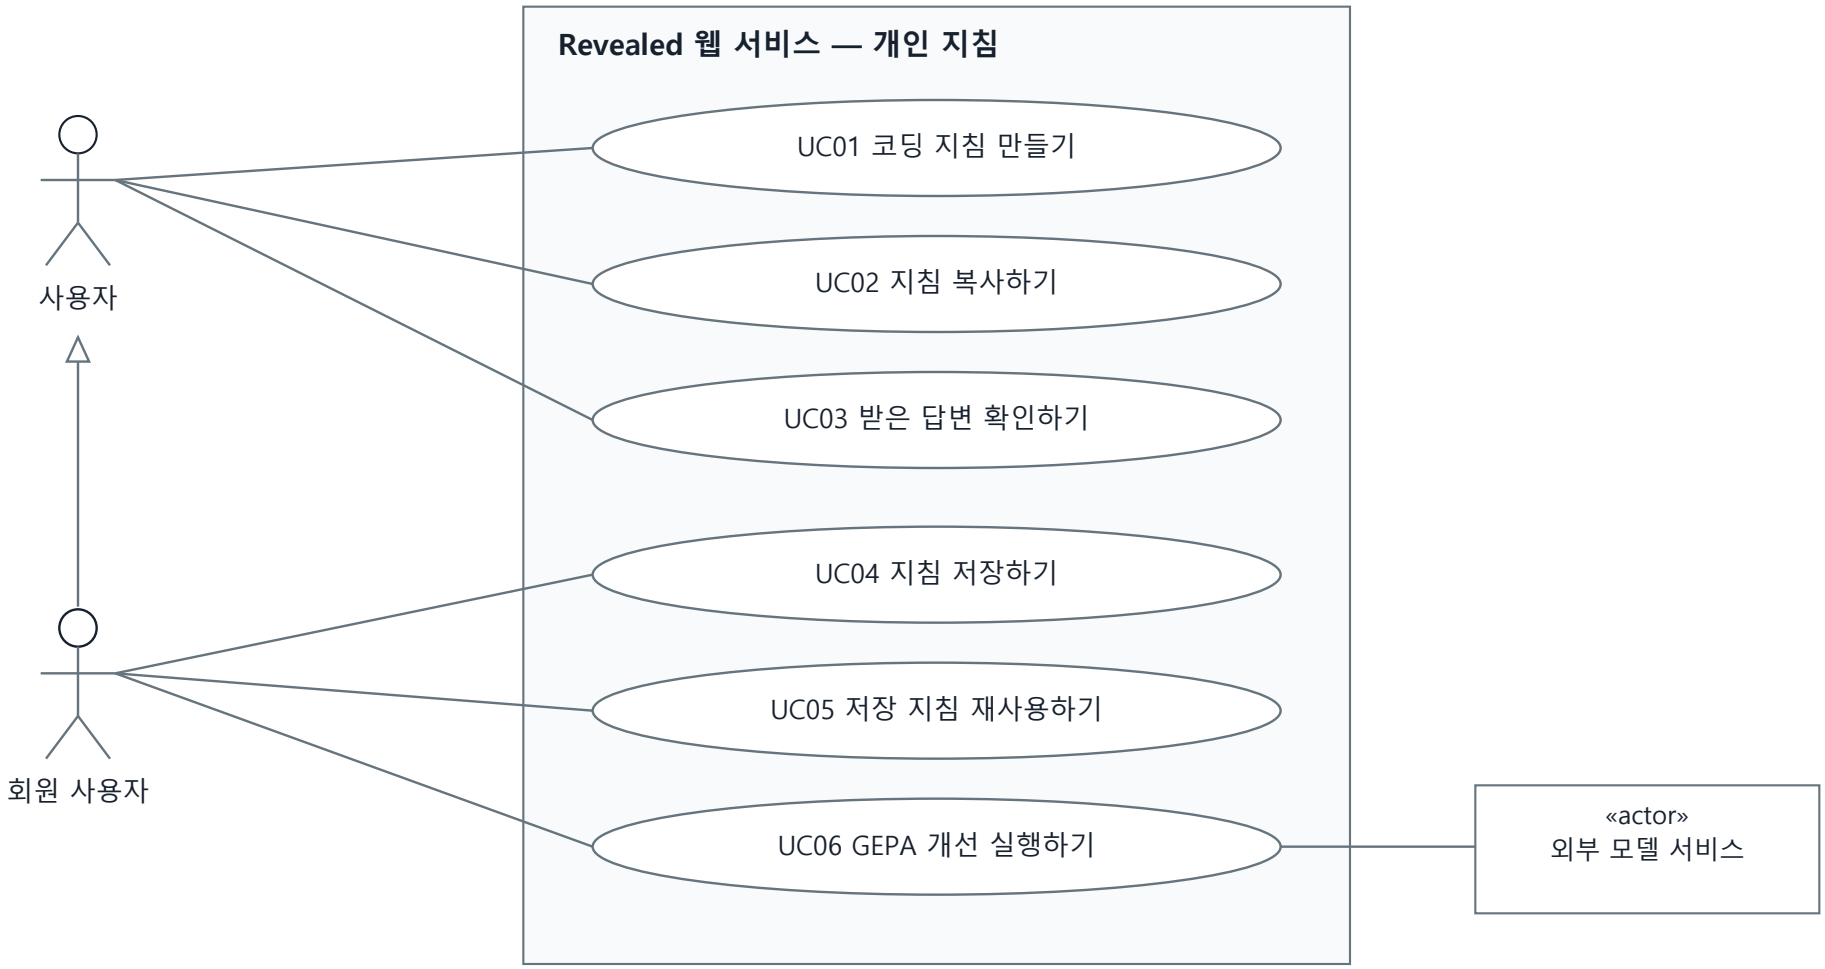

회원은 사용자 기능을 상속한다. UC04~06은 로그인 필요. UC06은 지원 환경·실행 가능 조건을 확인한다.

[설계] UML - 인증·저장 Class


빈 삼각형: 상속 · 점선: 의존 · 실선 화살표: 연관 | GEPA 작업 클래스·전체 메서드는 상세 설계문서

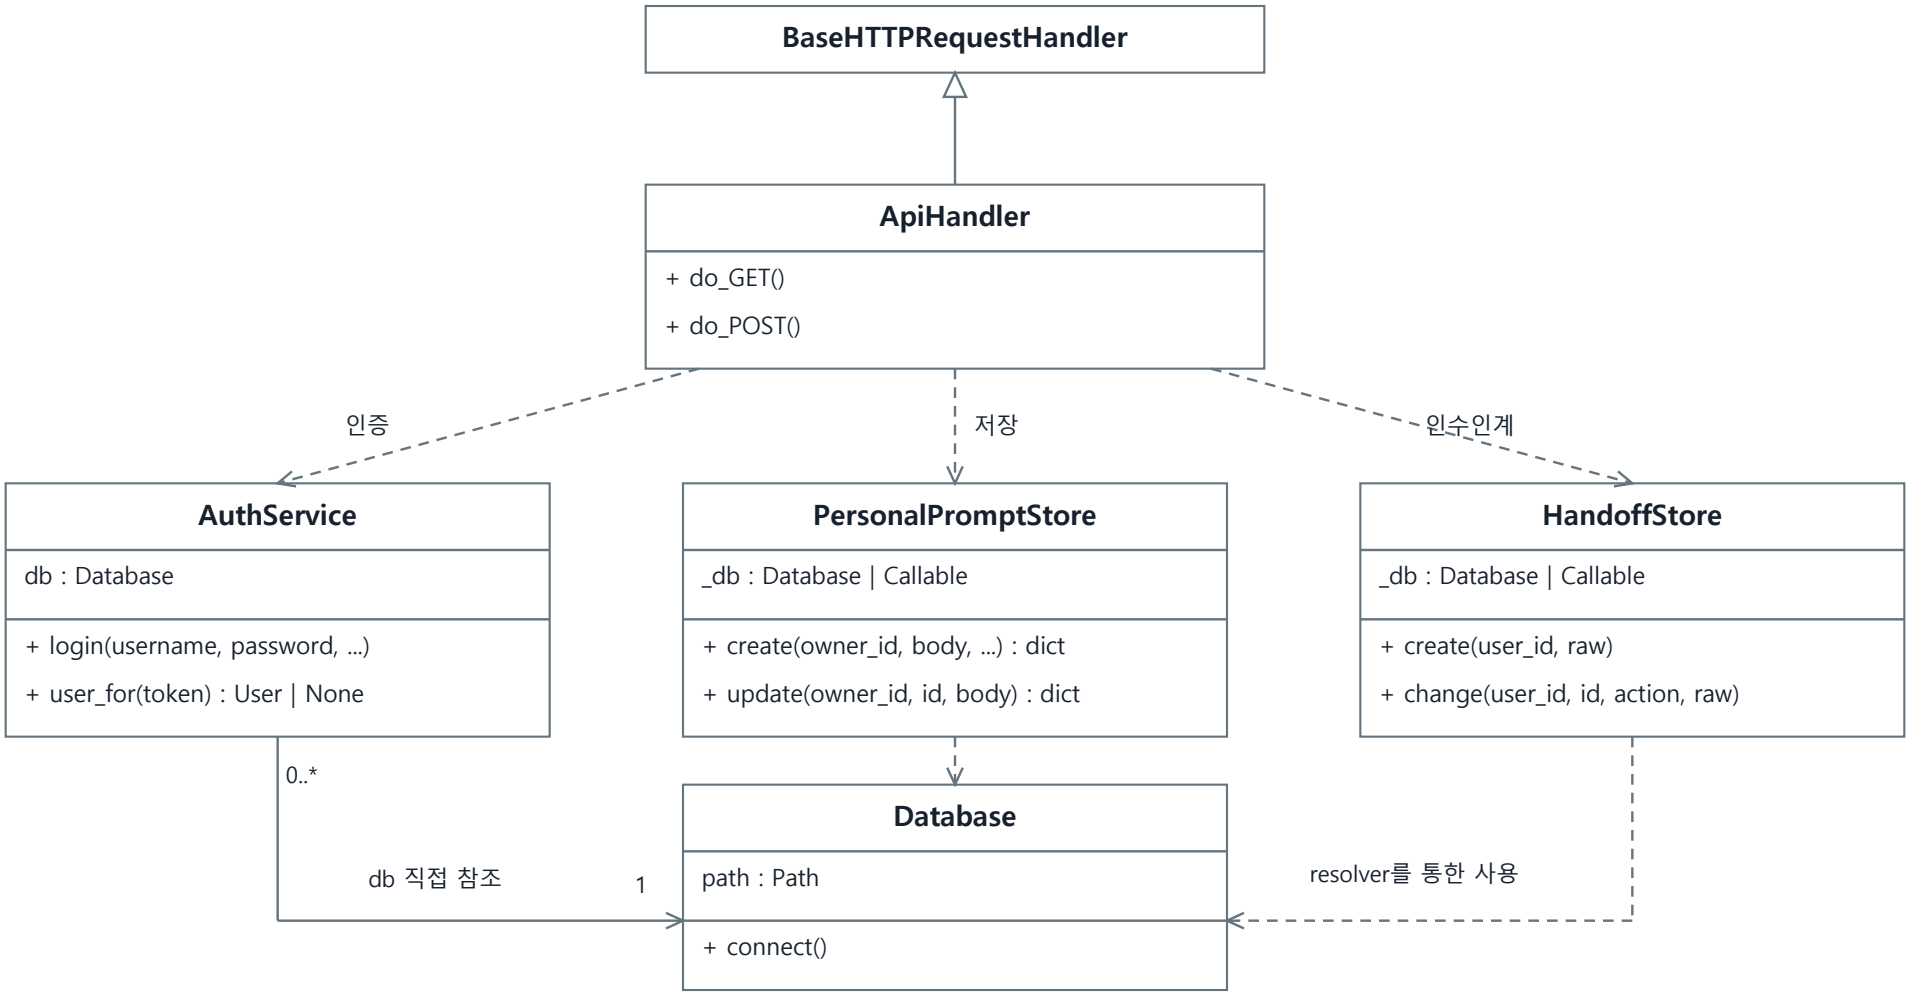

현재 API 연결 기준: AuthService.db는 DB 직접 참조. 두 Store의 _db에는 lambda: DB를 보관하고 db 속성에서 조회한다.
생성자는 Database도 허용하지만 현재 resolver 경로를 의존으로 표시했다. 세 객체가 모두 DB를 직접 보관한다는 뜻은 아니다.

[설계] 데이터베이스 구성 - ERD

관계형 DB 설계도 (UML과 별개) | 핵심 8개 테이블 / 전체 13개 테이블의 컬럼·DDL은 설계문서

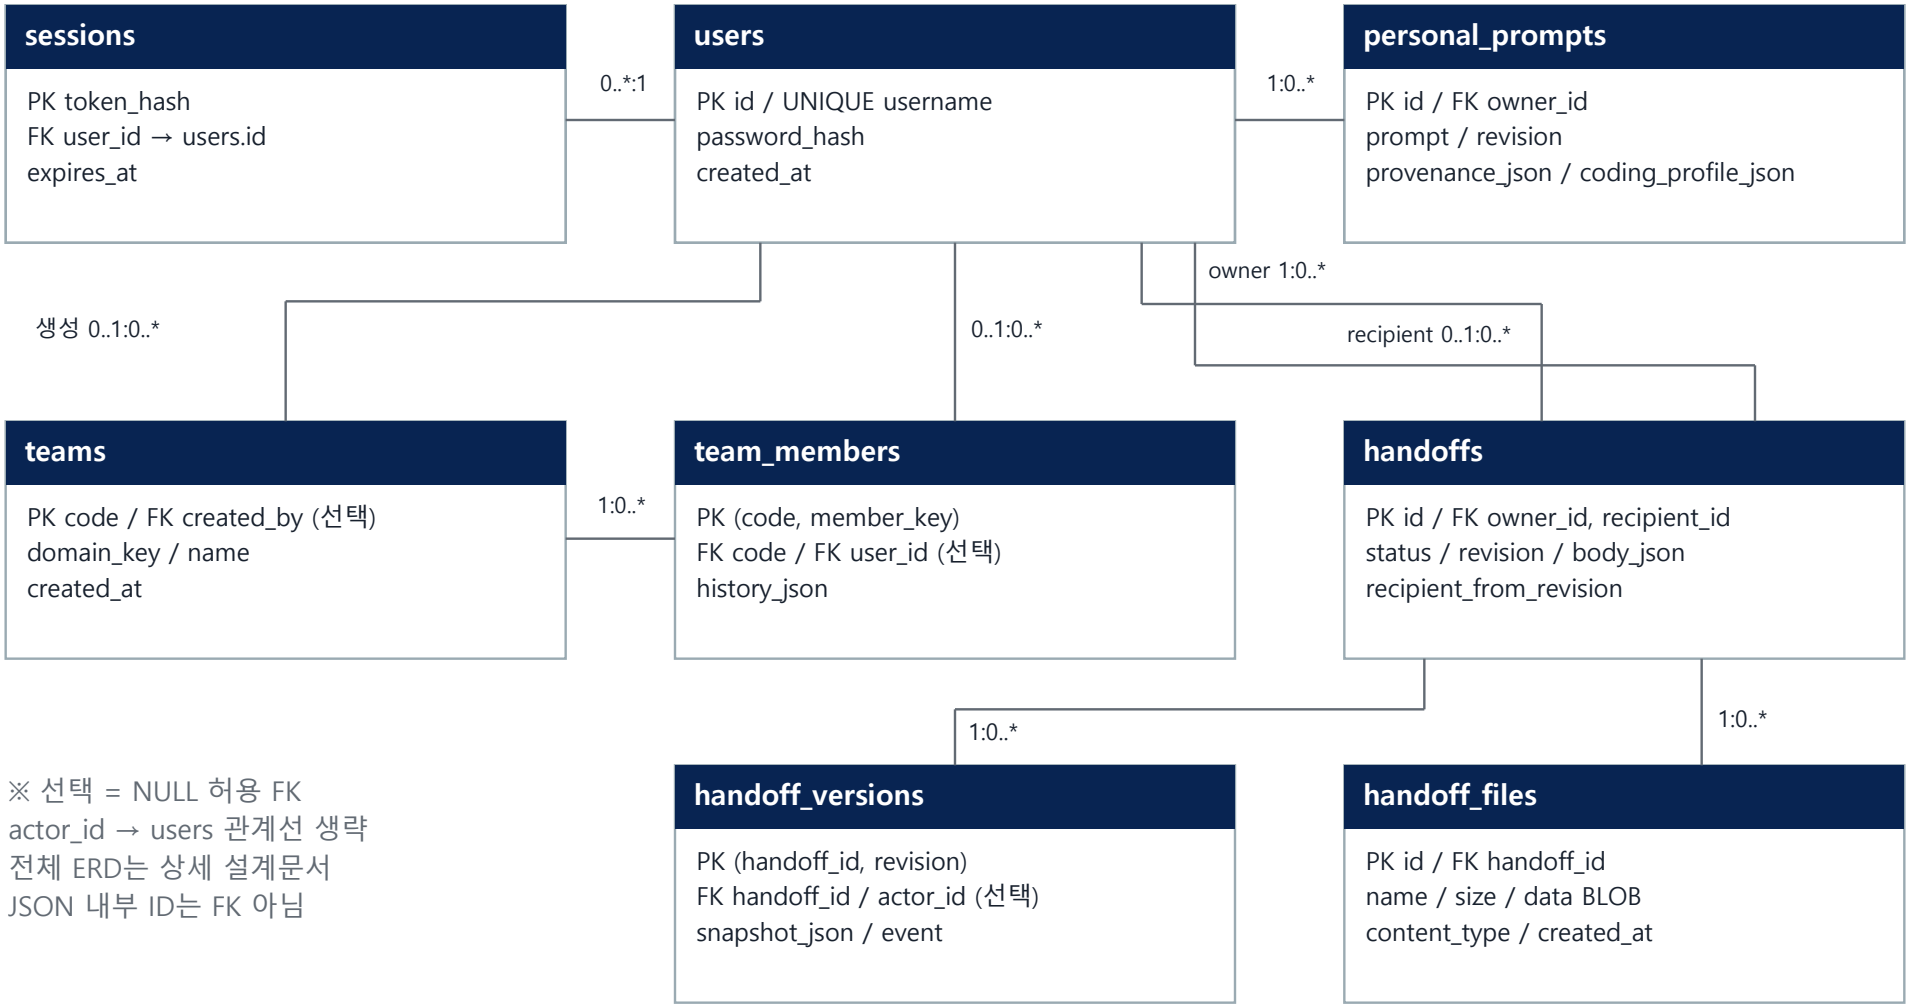

※ 선택 = NULL 허용 FK
actor_id → users 관계선 생략
전체 ERD는 상세 설계문서
JSON 내부 ID는 FK 아님

[설계] 테이블 정의와 저장 규칙

원문 DDL과 전체 컬럼·타입·PK·FK·NULL 선언·기본값을 별도 문서에 수록

영역 / 테이블	보관하는 자료	중요 규칙
계정 users / sessions	사용자·해시 비밀번호·해시 세션 토큰	계정 삭제 시 세션 CASCADE
개인 지침 personal_prompts	지침·선호 설정·출처 스냅샷·revision	원문/새 작업 자동 저장 안 함 재조합은 새 ID로 보관
팀 기준 teams / team_members	팀 이름·분류·팀원별 선택 이력	team_members 복합 PK(code,member_key) 명시적으로 합친 선택만 반영
인수인계 handoffs / handoff_versions	현재 상태·목적·진행·남은 일·버전 기록	공유 시작 revision 이전 수신자 열람 차단 변경 충돌 시 409
첨부 handoff_files	파일 원본 BLOB·크기·MIME	목록 제외 후에도 과거 버전 보존 파일 5MiB / 작업 전체 20MiB
업무 작업 공간 / 사용량	workspace_* 4개 / usage	프로젝트·저장 버전·권한·초안 / 하루 한도

최적화 진행 작업은 DB 테이블이 아니라 프로세스 메모리. 저장한 개선 지침만 personal_prompts에 보관.

[설계] 내부·외부 인터페이스 / API

JSON UTF-8 · 세션 쿠키 · 소유권 / revision 확인 | 명세의 요청·응답·오류는 현행 코드 기준


경로 (핵심 발췌)	메서드	입력 → 응답
/api/coding-instructions/preview	POST	profile → 200 draft / 모델 호출 없음
/api/coding-instructions/review	POST	profile, answer → 200 inspection
/api/preferences	GET / POST	목록 200 / title,domainKey,prompt → 저장 201
/api/preferences/{id}/update	POST	revision + 지침 필드 → 200 / 충돌 409
/api/preferences/{id}/compose-task	POST	팀 snapshot + 항목 선택 → 200 draft
/api/handoffs	GET / POST	작업 목록 / 목적·진행·남은 일 → 저장 201
/api/handoffs/{id}/share, claim, attach	POST	수신자 지정 / 이어받기 / Base64 첨부
/api/coding-instructions/optimizations	GET / POST	실행 가능 범위 200 / 작업 시작 202
/api/coding-instructions/optimizations/{id}/save	POST	title, 선택적 직접 판단 → 새 지침 201

외부 연결

실제 AI 실행 시 서버가 지침·과제를 전송. 단순 조립·답변 확인·첨부는 자동 AI 전송 없음.
호스팅은 준비 단계. 명세는 이번 핵심 변경 범위이며 기존 전체 API의 전수 명세는 별도 확장.

[설계] 화면 흐름 · 요약 와이어프레임

대표 흐름: 환경 선택 → 선호 결정 → 지침 확인 → 저장·새 작업 재사용

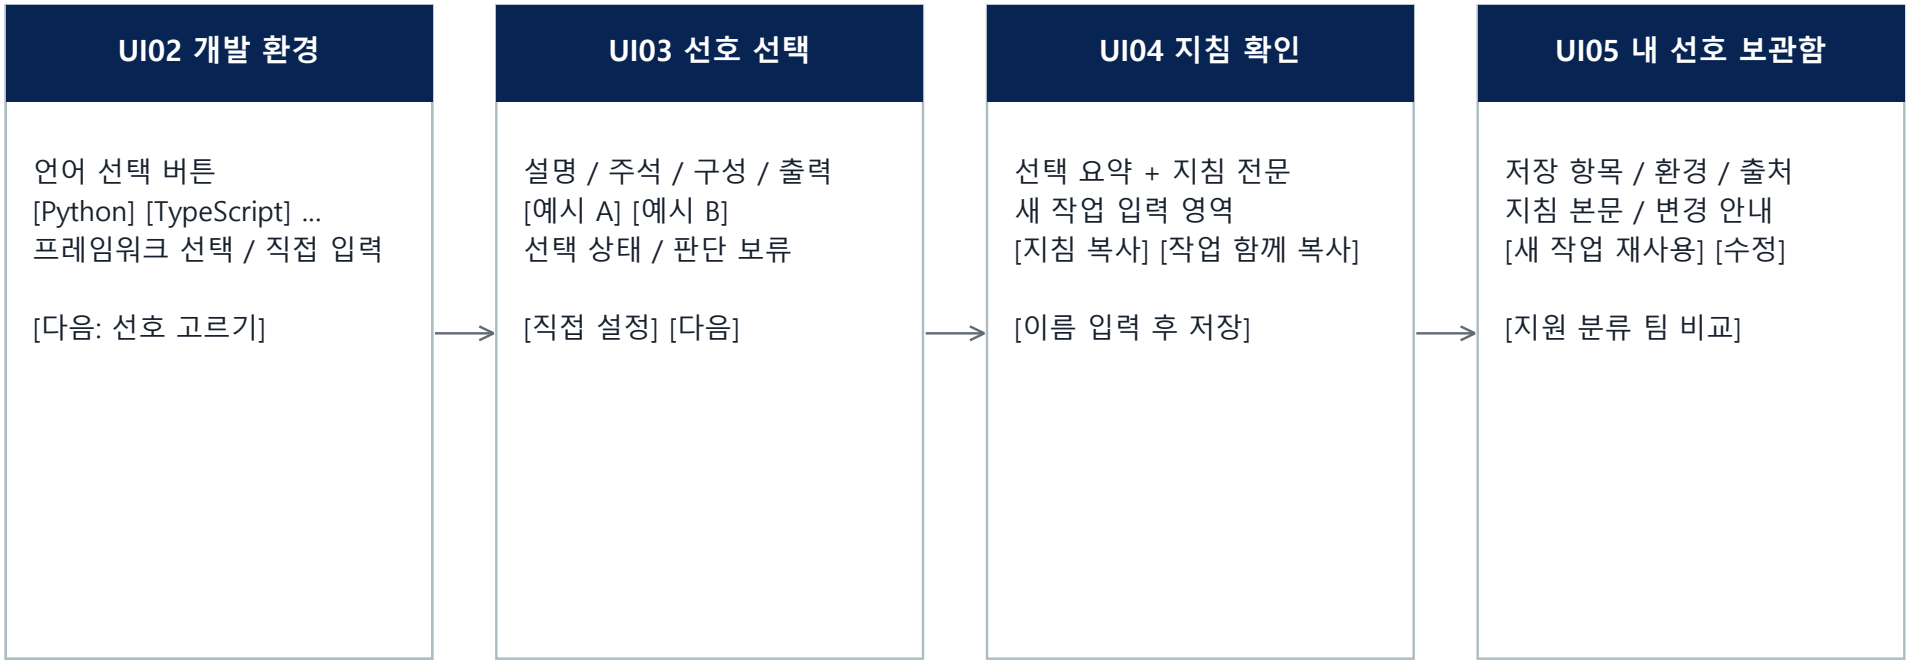

상태·예외까지 화면 사양에 포함

① 처음에는 미선택 ② 보류는 자동 채우지 않음 ③ 환경 변경 시 선택 출처 초기화
④ 저장·재사용 시 로그인과 버전 확인 ⑤ 직접 설정 지침은 개인용 재사용
현재 남은 문제: 상단 메뉴 이동 시 초안 소실 / GEPA 진행·완료 작업 재열기 누락


[구현 화면] 선택·지침·보관·새 작업

윤정우 진행 영역 | 단순 프롬프트 생성에서 저장·재사용까지 이어지는 흐름


① 코드 예시로 네 가지 선호 선택



② 선택 요약과 생성 지침 전문

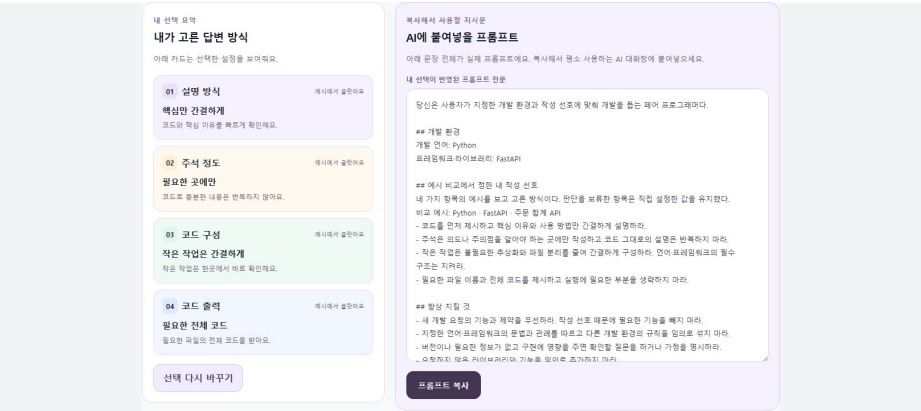

③ 요약·코딩·조합을 함께 보관

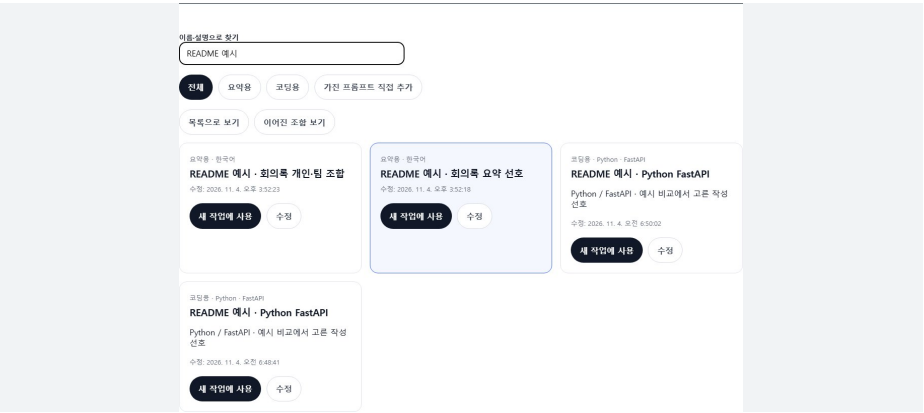

④ 지침과 이번 작업을 함께 복사



11/04 격리된 예시 계정의 실제 로컬 화면. 데모·준비 자료를 포함하며 새 AI 효과 실험 화면이 아님.


[구현 화면] 팀 기준·인수인계·업무 초안

윤정우 진행 영역 | 지원 분류의 조합과 인수인계는 서로 다른 권한·사용 흐름

① 항목별 개인·팀 기준 조합



② 작업 목적·진행·남은 일 정리

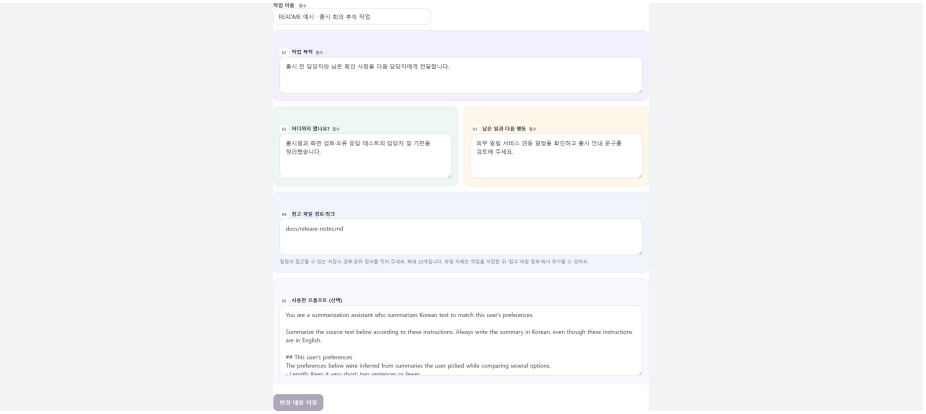

③ 참고 파일 원본의 열기·다운로드



④ 반복 업무 템플릿과 요청 점검



11/04 격리된 예시 계정의 실제 로컬 화면. 데모·준비 자료를 포함하며 새 AI 효과 실험 화면이 아님.
